

Resumen de ejecución

Hacer confiable el ciclo de coaching antes de ampliarlo.

RESULTADO ejecución inmutable, reintentos seguros y revisión accionable

CAPACIDAD 2 desarrolladores × 6 días enfocados

ALTERNATIVA 1 desarrollador × 9–10 días enfocados

01 **PROGRAMAR**

02 **EJECUTAR**


03 **DETECTAR**

04 **REVISAR**

05 **AJUSTAR**

Tesis del producto


Forja es el ciclo operativo entre la prescripción y el ajuste.



PRUEBA PILOTO

Una sesión asignada se convierte en evidencia durable, revisión priorizada y ajuste deliberado.

Tres actores, un solo ciclo



Regla de optimización

Nunca mejorar la experiencia de un actor debilitando la confianza de otro en los mismos datos.

Los equipos importan cuando son necesarios. La multitenencia empresarial no demuestra este piloto.

Recorridos y capacidades actuales

COACH

Inicio de sesión + autorización

Panel + atletas

Planificación + marcas

Historial + E/S de Excel

ATLETA

Activación PIN / OTP

Entrenamiento de hoy

Registro de series + día

Vista de progreso

SISTEMA

Drizzle / libSQL


Auth.js

Evolution API

Cola offline parcial

La base es suficiente. El límite del piloto es la integridad y el foco operativo, no la cantidad de funciones.

Arquitectura actual del sistema



RIESGO DE CASCADA / MUTACIÓN

El rendimiento completado no tiene una instantánea de sesión independiente.

ADEMÁS las transacciones y restricciones están incompletas

ADEMÁS los reintentos offline carecen de un contrato idempotente

ADEMÁS las semánticas de calendario y pendientes divergen

Bases que debemos conservar

STACK

Next.js 16 · TypeScript · Tailwind v4

DATOS

Drizzle + libSQL

IDENTIDAD

Auth.js + propiedad verificada en servidor

ACTIVACIÓN

OTP de WhatsApp vía Evolution API

OPERACIONES

Puente Excel + cola offline parcial

DOMINIO

Jerarquía del programa + marcas de fuerza

Dirección: monolito modular con operaciones explícitas de dominio, no nuevas unidades de despliegue.

Brechas críticas

01 Plan mutable ↔ historial

Pérdida de datos / evidencia reescrita

02 Sin instantáneas de sesión

No hay agregado durable de ejecución

03 Garantías débiles de escritura

Riesgo de reintento, parcialidad y duplicación

04 El panel no es una bandeja

Conteos sin siguiente acción

05 %RM sin resolver

Prescripción ambigua al ejecutar

06 Evidencia de lanzamiento incompleta

Brechas de CI, E2E, restauración y operación

Detención obligatoria: no hay piloto si historial, idempotencia, autorización, migración o restauración están en rojo.

Límite del MVP piloto

DEBE

- Instantáneas de sesión + rendimiento
- Estados + transiciones seguras
- Transacciones + idempotencia
- Bandeja + calendario canónico
- Instantánea %RM + logout
- Migración / restauración / E2E

DEBERÍA

- Duplicar unidades del plan
- Confirmación de revisión
- Estado del sistema
- Edición de series más rápida

DESPUÉS


- Multitenencia empresarial
- IA / chat / nutrición
- Facturación / marketplace
- Rebranding final

Ejecución paralela en seis días

DÍA	DESARROLLADOR A	DESARROLLADOR B	DEMO
1	Esquema + ciclo de vida	Semántica + fixtures	contrato
2	Comandos transaccionales	Atleta + adaptador offline	guardado
3	Lecturas de instantáneas	Resolución %RM	historial
4	Bandeja del coach	Alineación de calendario	revisión
5	Revisión + planificación	Logout + robustez de sync	recorrido
6	Migración + recuperación	E2E + accesibilidad	evidencia

Alternativa con una persona: 9–10 días · mismo orden · quitar primero lo opcional.

Dominio y modelo de datos objetivo

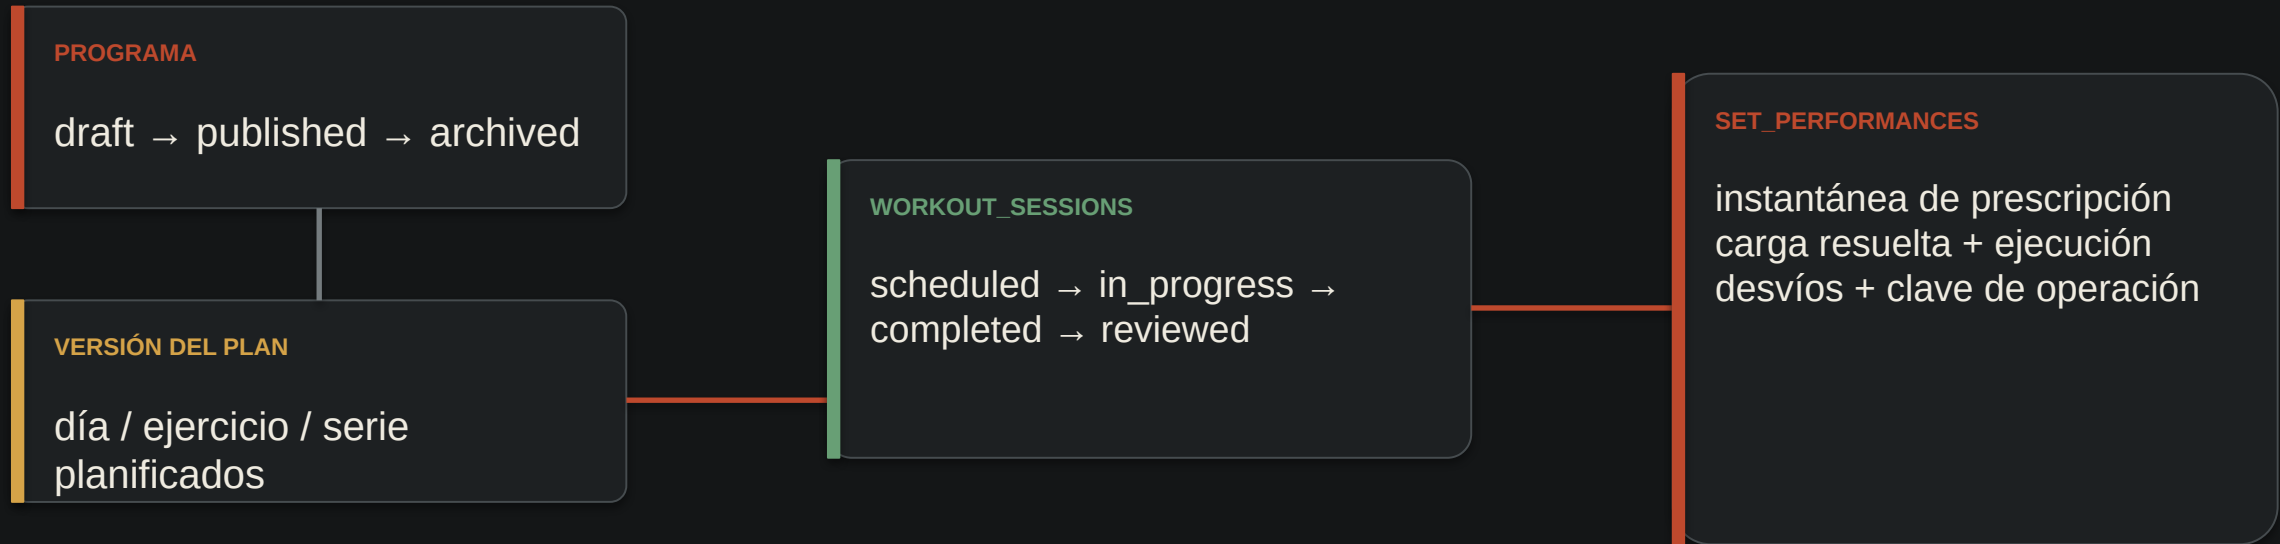

INVARIANTE editar el plan nunca reescribe evidencia completada

REINTENTO la clave estable devuelve el resultado aceptado

COMMIT rendimientos + cierre + evento de bandeja son atómicos

Verificación y condiciones de salida



DATOS

Migración + restricciones + restauración



COMANDO

Duplicación + fallo parcial



HISTORIAL

Cambiar el plan no altera la instantánea



ACCESO

Rechazo cruzado + sesión cerrada



RECORRIDO

Publicar → ejecutar → revisar → ajustar



OPERACIÓN

Build + smoke + ensayo de rollback

La decisión es binaria: todo lo obligatorio en verde o reducir alcance y repetir la evidencia.

Traspaso y punto de partida recomendado

Empezar por el contrato de ejecución, no por el panel.

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 01 | Fijar el fixture piloto | actor, calendario, %RM, desviación y reintento |
| 02 | Agregar instantáneas | sesión + rendimiento + restricciones |
| 03 | Controlar los comandos | autorización + transacción + idempotencia |
| 04 | Migrar las proyecciones | primero historial, luego bandeja |
| 05 | Demostrar el lanzamiento | migración + recuperación + recorrido completo |

SIGUIENTE: CONTRATO DEL DÍA 1
